



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA,
ESTADO DE CAMPECHE
PERÍODO 2021- 2024
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

062



CONTRATO No.	HAC/DOPDU/FAISM-058/2022 ✓
OBRA	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA LOCALIDAD ALIANZA PRODUCTORA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA.
UBICACIÓN Y LOCALIDAD	ALIANZA PRODUCTORA. ✓
IMPORTE	\$ 1,399,476.50 ✓
FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM). ✓
OFICIO DE APROBACIÓN	FISM-22-M-APR011062 ✓
FECHA DE APROBACIÓN	11/07/2022 ✓
RUBRO DE GASTO Y MODALIDAD	SJ.- INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, C.- CONSTRUCCION. ✓

CONTRATO DE OBRA.

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “EL CONTRATO” QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL **MUNICIPIO DE CANDELARIA**, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARÁ “EL CONTRATANTE”, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL **LIC. FRANCISCO JAVIER FARIAS BAILON**, EN SU CALIDAD DE **PRESIDENTE MUNICIPAL** Y POR LA OTRA PARTE **C. CARLOS DE JESUS ORTEGA ALVAREZ** QUE CONCURRE POR CONDUCTO DEL **C. CARLOS DE JESUS ORTEGA ALVAREZ** EN SU CALIDAD DE **REPRESENTANTE LEGAL**, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO “EL CONTRATISTA”; Y QUE CUANDO ACTÚEN DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ “LAS PARTES”, AL TENOR DE LOS ANTECEDENTES; DECLARACIONES; CLÁUSULAS Y ACUERDOS SIGUIENTES.

ANTECEDENTES:

✓ **PRIMERO.-** De acuerdo a los programas para la realización de obras públicas, se ha considerado procedente y necesaria la ejecución de los trabajos correspondientes a este contrato, así mismo se estipula que las erogaciones que deriven del presente contrato se cubrirán con recursos de: **FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM) EJERCICIO 2022.**

SEGUNDO.- Que la asignación de “EL CONTRATO” se realizó por la modalidad de **invitación a cuando menos tres contratistas**, derivado de la convocatoria **MCA/DOPDU/FAISM-SJ-01/2022** de fecha **1 DE SEPTIEMBRE DE 2022**, con fundamento con los términos establecidos en los preceptos legales de los Artículos 26 y 30 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Campeche.

Hoja No. 1



DECLARACIONES:

I. Declara "EL CONTRATANTE" por conducto de su representante legal, bajo protesta de decir verdad que:

I. 1. Que el Municipio de Candelaria, es la base de la división territorial y de la Organización Política Administrativa del Estado, de carácter público e investido de personalidad jurídica y patrimonio propio, autónomo en su régimen interior y con libre administración de su hacienda, en los términos del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

I. 2. Que el Municipio de Candelaria, pertenece al Estado de Campeche y que fue creado por Decreto Número 57, tal como fue publicado el Diecinueve de junio de Mil Novecientos Noventa y Ocho en el Periódico Oficial del Estado de Campeche, es un Municipio Libre y autónomo, tal como lo dispone el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3º, 4º y 102 de la Constitución Política del Estado de Campeche y los artículos 1, 2, 4, 5 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche en Vigor, y como es notorio y público es gobernado y administrado por su Ayuntamiento.

I. 3. Que su representante legal es el **LIC. FRANCISCO JAVIER FARIAS BAILON**, quien cuenta con las facultades bastantes y suficientes para celebrar este convenio de colaboración, tal y como lo establece el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 3º, 4º, 102, 105, 106 y 108 de la Constitución Política del Estado de Campeche; los artículos 1, 2, 4, 5, 69 fracción XII, XVI y XXII, 71, 102, 105, 151 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche. Que tal carácter lo acredita con la constancia de mayoría expedida a su favor, por el Instituto Electoral del Estado de Campeche, de fecha doce de Junio de Dos Mil Veintiuno, lo anterior adquiere mayor firmeza con la publicación de fecha 12 de octubre de 2021 en el Periódico Oficial del Estado, en la cual se dan a conocer los resultados del Proceso Electoral Estatal Ordinario 2021, para el período comprendido entre del 1º de octubre de 2021 al 30 de septiembre de 2024.

I. 4. Tener su domicilio fiscal el ubicado en la Av. 1ero. de Julio S/N., entre 15 y 17, Colonia Centro, C. P. 24330 en la Ciudad de Candelaria, Campeche, que cuenta con Registro Federal de Contribuyentes número MCC-980701-NU1.

II. Declara "EL CONTRATISTA" por conducto de su representante legal, bajo protesta de decir verdad que:

✓ II. 1. Es de nacionalidad mexicana, con **27** años de edad y declara, bajo protesta de decir verdad que se encuentra inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes del Servicio de Administración Tributaria (SAT), con RFC **OEAC-900507-L26**.

II. 2. Tiene capacidad jurídica para contratar y obligarse a la realización de la obra objeto de "EL CONTRATO".

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA,
ESTADO DE CAMPECHE
PERÍODO 2021- 2024
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO



- II. 3. Cuenta con la capacidad, los conocimientos profesionales y técnicos, la experiencia necesaria, aptitudes, infraestructura y personal necesario, o en su caso se compromete a contratar a personas físicas o morales para atender lo estipulado en **"EL CONTRATO"**.
- II. 4. Que conoce plenamente el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obras Públicas del Estado de Campeche y su Reglamento, y las reglas generales para la contratación y ejecución de las obras públicas y servicios relacionados con las mismas, para las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y Estatal, el contenido de los anexos que debidamente firmados por las partes que integran el presente contrato, así como la normas técnicas y administrativas que regulan la ejecución de los trabajos.
- II. 5. Que conoce y ha inspeccionado debidamente y con detalle el sitio de ejecución de la obra objeto de **"EL CONTRATO"**. A fin de considerar amplia y detalladamente todos los factores que intervienen en la realización de la misma.
- II. 6. Su domicilio para los efectos del presente Contrato se encuentra ubicado en: **CARRETERA (CARR.) CALLE MICHUACAN ENTRE GUANAJUATO, VENUSTIANO CARRANZA, S/N., ENTRE SIN CALLE Y SIN CALLE, COLONIA OTRA NO ESPECIFICADA EN EL CATALOGO, C.P. 24333, OTRA NO ESPECIFICADA EN EL CATALOGO, CANDELARIA, CAMPECHE.**

III. Declaran **"LAS PARTES"** que:

- III. 1. Que en el presente **"CONTRATO"**, no existe dolo, ni mala fe, ni error, ni violencia, ni enriquecimiento ilícito, ni cualquier otro vicio del consentimiento que pudiera anular el mismo, y que es la simple manifestación de voluntades.
- III. 2. Es su voluntad celebrar el presente **"CONTRATO"** en los términos y condiciones establecidos en el mismo.
- III. 3. De conformidad con las anteriores declaraciones, las partes reconocen su personalidad jurídica y la capacidad legal que ostentan, así como el alcance y contenido de este **"CONTRATO"** y están de acuerdo en someterse a las siguientes:

CLÁUSULAS:

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO.

"LAS PARTES" convienen que el objeto de **"EL CONTRATO"** es la realización de la obra que se describe a continuación:

obra

CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA LOCALIDAD ALIANZA PRODUCTORA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA.

Ubicación y localidad

ALIANZA PRODUCTORA.

Hoja No. 3

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA,
ESTADO DE CAMPECHE
PERÍODO 2021- 2024
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO



Por lo que "EL CONTRATANTE" encomienda a "EL CONTRATISTA" y este último a su vez se obliga a realizar para el primero la obra descrita hasta su total terminación, de conformidad con las normas de construcción, especificaciones, proyectos, catálogos de conceptos de trabajo, precios unitarios, programas y presupuestos, que forman parte integrante de este contrato.

SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO.

"EL CONTRATANTE" se obliga a cubrir a "EL CONTRATISTA" la cantidad de: **\$ 1,399,476.50 son: (Un millón trescientos noventa y nueve mil cuatrocientos setenta y seis pesos 50/100 M.N.)** que incluye el pago del I.V.A.; por concepto de los trabajos estipulados en la cláusula que anterior.

TERCERA: VIGENCIA.

"EL CONTRATISTA" se obliga a iniciar los trabajos objeto de este contrato el día **21 de septiembre de 2022**, y terminarlos a más tardar el día **19 de noviembre de 2022**, de conformidad con el programa de obra correspondiente.

CUARTA: DISPONIBILIDAD DEL LUGAR.

"EL CONTRATANTE" se obliga a poner a disposición de "EL CONTRATISTA" el o los sitios en donde deben llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, así como los dictámenes, permisos, licencias, y demás amortizaciones que se requieran para la realización de los mismos. El incumplimiento en la disponibilidad del inmueble por parte de "EL CONTRATANTE" prorrogará en igual plazo la fecha original pactada de terminación de los trabajos.

QUINTA: ANTICIPOS.

Para el inicio de los trabajos objeto de "EL CONTRATO" "EL CONTRATANTE", otorgara un anticipo por el **30%** (treinta por ciento) por única vez de la asignación aprobada para la obra correspondiente para el primer ejercicio presupuestario que importa la cantidad de: **\$ 419,842.95 son: (Cuatrocientos diecinueve mil ochocientos cuarenta y dos pesos 95/100 m.n.)** con el I.V.A. incluido, que será entregado a "EL CONTRATISTA" con antelación máxima de un mes a la fecha pactada para el inicio de los trabajos y este se obliga a utilizarlo en la realización de los mismos. El anticipo se otorgara previa recepción por "EL CONTRATANTE" de las garantías, para lo cual "EL CONTRATANTE" se compromete a poner a disposición de "EL CONTRATISTA" el anticipo mencionado.

Para la amortización de los anticipos, por inicio de los trabajos y compra o producción de los materiales, se sujetará a los procedimientos establecidos al respecto por la Ley de Obras Públicas del Estado de Campeche en vigor, su reglamento y en especial a lo siguiente:

- I. la amortización deberá efectuarse en forma proporcional con cargo a cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados que se formulen debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la estimación final. El porcentaje inicial de amortización será el resultado de dividir la o las cantidades recibidas por conceptos de anticipos por el importe de la obra.



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA,
ESTADO DE CAMPECHE
PERÍODO 2021- 2024
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO



II. Para la amortización de los anticipos en los casos de rescisión de contrato, el saldo por amortizar se reintegrará a **"EL CONTRATANTE"** en un plazo no mayor de 15 (quince) días hábiles, contados a partir de la fecha en que sea comunicada la rescisión a **"EL CONTRATISTA"**.

En caso de que **"EL CONTRATISTA"** no reintegre el saldo por amortizar, deberá pagar gastos financieros conforme a una tasa que será igual a la establecida por la ley de ingresos de la federación en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales, los gastos financieros se calcularán sobre el saldo no amortizado y se computarán por días calendario desde que se venció el plazo, hasta la fecha en que se ponga la cantidad a disposición de **"EL CONTRATANTE"**.

SEXTA: FORMA DE PAGO Y LUGAR DE PAGO.

Los trabajos, objeto de **"EL CONTRATO"** serán pagados en moneda nacional de curso legal, durante la ejecución de los trabajos, por lo que cubrirá las estimaciones por trabajos ejecutados dentro de un plazo no mayor de 30 (treinta) días hábiles, contados a partir de la fecha en que se hubieren aceptado y firmado las estimaciones; señalando **"EL CONTRATANTE"** como domicilio convencional para efectos de pago, el ubicado en **Av. 1ero. de Julio S/N, entre 15 y 17, Col. Centro, C. P. 24330** de la **Ciudad de Candelaria, Estado de Campeche**, previa presentación de los comprobantes (CFDI), que se realizarán de acuerdo a las leyes fiscales vigentes, que reúna los requisitos fiscales, en las oficinas de la Tesorería Municipal, y una vez realizado el pago, deberá enviar en un lapso de 3 días naturales del mismo mes, el comprobante fiscal de pago correspondiente.

Para el caso en que se cubran pagos por exceso, que haya recibido **"EL CONTRATISTA"** éste se compromete a reintegrar los mismos, así como los intereses correspondientes, conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación, en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Los recargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por día calendario desde la fecha de pago, hasta la fecha en que se pongan efectivamente a disposición de **"EL CONTRATANTE"**.

SÉPTIMA: AJUSTE DE COSTOS.

Cuando a partir de la presentación de las propuestas, ocurran circunstancias de orden económico no previstas en el presente contrato que determinen un aumento o reducción de los costos de los trabajos aún no ejecutados conforme al programa pactado, dichos costos cuando proceda, deberán ser ajustados atendido al procedimiento de ajuste de costos acordado por las partes conforme a lo establecido en el Artículo 43 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Campeche y Artículo 41 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Estado de Campeche.

No dará lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias que conforme a la ley de la materia, pudiera estar sujeta la importación de los bienes contemplados en la realización de la obra.

Los ajustes se calcularán a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en el costo de los insumos respecto de la obra faltante de ejecutar, conforme al programa de ejecución pactado, o en caso de existir atraso no imputable a **"EL CONTRATISTA"**, con respecto al programa convenido.

Hoja No. 5



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA,
ESTADO DE CAMPECHE
PERÍODO 2021- 2024
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO



De conformidad con el Artículo 18 Fracción VII del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Estado de Campeche (RLOPEC), los ajustes de costos deberán afectarse en un porcentaje igual al de los anticipos concedidos.

Cuando el atraso sea por causa imputable a **"EL CONTRATISTA"** procederá al ajuste de costos, exclusivamente para la obra que debiera estar pendiente de ejecutar conforme al programa convenido (Art. 42 Fracción I) del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Estado de Campeche (RLOPEC).

Para efectos de la revisión y ajuste de costos, la fecha de origen de los precios será la del acto de presentación y apertura de propuestas técnicas.

Cuando la obra dé inicio dentro de los 30 días naturales siguientes a la presentación de las propuestas de conformidad con la Ley de Obras Públicas del Estado de Campeche, el ajuste de costos en este período no aplicará.

Los ajustes se calcularán a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en el costo de los insumos, respecto de la obra faltante de ejecutar conforme al programa de ejecución pactado en el contrato o en el caso de existir atraso no imputable al contratista, con respecto al programa que se hubiese convenido, (Art. 42 Fracción I del RLOPEC).

Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos serán calculados con base al Índice Nacional de Precios al Productor con servicios, que determine el Banco de México. Cuando los índices que requieran **"EL CONTRATISTA"** y/o **"EL CONTRATANTE"**, no se encuentren dentro de los publicados por el Banco de México, **"EL CONTRATANTE"** procederá a calcularlos conforme a los precios que investigue, utilizando los lineamientos y metodología que expida el Banco de México.

Los precios originales del contrato permanecerán fijos, hasta la terminación de los trabajos contratados. El ajuste se aplicará a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidad originales, durante el ejercicio del contrato; el costo por financiamiento estará sujeto a las variaciones de la tasa de interés que **"EL CONTRATISTA"** haya considerado en su propuesta.

De conformidad con el Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Estado de Campeche, **"EL CONTRATISTA"**, dentro de los 60 días naturales siguientes a la publicación de los índices aplicables al periodo que los mismos indiquen, deberá presentar por escrito la solicitud de ajuste de costos a **"EL CONTRATANTE"**, transcurrido dicho plazo, precluye el derecho de **"EL CONTRATISTA"** para reclamar el pago; y **"EL CONTRATANTE"**, dentro de los 60 días naturales siguientes a la recepción de la solicitud, deberá emitir por escrito la resolución que proceda; si **"EL CONTRATANTE"** autoriza el ajuste de costo, su cálculo se llevará a cabo, conforme a lo establecido en la Ley de Obras del Estado de Campeche, y de acuerdo a su Reglamento, debiendo acompañarlo con la siguiente documentación:

I. La relación del Índice Nacionales de Precios al Productor con servicios que determine el Banco de México, en su caso, los índices investigados por **"EL CONTRATANTE"** los que deberán ser proporcionados a **"EL CONTRATISTA"**.

II. El presupuesto de los trabajos pendientes de ejecutar, de acuerdo al programa convenido, en el periodo en el cual se produzca el incremento en los costos, valorizado con los precios unitarios del contrato.

Hoja No. 6



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA,
ESTADO DE CAMPECHE
PERÍODO 2021- 2024
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO



III. El presupuesto de los trabajos pendientes de ejecutar, de acuerdo al programa convenido, en el periodo en el cual se produzca el incremento de los costos, valorizado con los precios unitarios del contrato, ajustado conforme a lo señalado en la Ley de Obras Públicas del Estado de Campeche.

IV. El programa de ejecución de los trabajos pendientes por ejecutar, acorde al programa que se tenga convenido.

V. El análisis de la determinación del factor de ajuste, y las matrices de precios unitarios actualizados que determinen conjuntamente **"EL CONTRATISTA"** y **"EL CONTRATANTE"**, en función de los trabajos a realizar en el periodo de ajuste.

El pago de los ajustes de costos y en su caso, del costo por financiamiento, se efectuarán de acuerdo al Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Estado de Campeche.

OCTAVA: GARANTÍAS.

"EL CONTRATISTA" se obliga a constituir fianza por el **10 %** (diez por ciento) del importe del contrato, mediante póliza de fianza expedida a favor de **"EL CONTRATANTE"** otorgada por una Institución Mexicana de Fianza en un plazo no mayor a 15 días hábiles contados a partir de la firma del presente contrato, conforme a lo establecido en la Ley de Obras Públicas del Estado de Campeche, ésta es otorgada por **"EL CONTRATISTA"** para garantizar las obligaciones contraídas en los términos del propio contrato la garantía del cumplimiento continuará vigente en los casos en que se otorguen prórrogas o esperas a **"EL CONTRATISTA"**.

Fianza por el importe del anticipo, para garantizar la correcta inversión del mismo, expedida por una Institución debidamente autorizada y a favor de **"EL CONTRATANTE"** esta fianza se cancelará cuando el contratista haya amortizado el importe recibido según lo establece el Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Estado de Campeche.

Las pólizas de fianzas que se expidan, deberán contener las siguientes declaraciones expresas de la institución que las otorgue:

A) De la Póliza de Fianza de Anticipo.

I. Que la misma se otorgue atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en **"EL CONTRATO"**, la Ley de Ley de Obras Públicas del Estado de Campeche, para las dependencias y entidades de la Administración Pública.

II. Que la fianza garantice la debida y correcta inversión del anticipo, así como la devolución total del mismo.

III. En caso que se prorrogue el plazo establecido para la terminación de los trabajos a que se refiere la fianza o exista espera, su vigencia quedará automáticamente prorrogada en concordancia con dicha prórroga o espera, esta fianza garantiza la ejecución total de las obras, materia de este contrato, aun cuando parte de ellas se subcontraten contando con la anuencia de **"EL CONTRATANTE"**. Así mismo, esta fianza permanecerá en vigor durante la sustanciación de todos los recursos legales y juicios que se interpongan hasta que haya una resolución definitiva de la autoridad competente.

Hoja No. 7



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA,
ESTADO DE CAMPECHE
PERÍODO 2021- 2024
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO



IV. Para cancelar la fianza será requisito indispensable la solicitud expresa y por escrito de **“EL CONTRATANTE”**.

V. Que la Institución Afianzadora acepte expresamente someterse a lo establecido por los artículos 282 y 178 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas en vigor.

B) De la Póliza de Fianza de Cumplimiento.

I. Que la fianza se otorgue atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en **“EL CONTRATO”**, en la Ley de obras Públicas del Estado de Campeche, su Reglamento y las Reglas Generales para la Contratación y Ejecución de las Obras Públicas, para Dependencias y Entidades de la Administración Pública.

II. Que la fianza garantiza la realización y ejecución en su totalidad de los trabajos materia de este contrato, obligándose la afianzadora al pago total de la misma, por el solo hecho de incumplir **“EL CONTRATISTA”**, incluyendo el pago de la pena convencional, hasta que se cubra el importe, aun cuando parte de ellos se subcontraten con la autorización de **“EL CONTRATANTE”**.

III. Que en caso de que se prorrogue el plazo establecido para la terminación de los trabajos a que se refiere la fianza, o exista espera, su vigencia quedará automáticamente prorrogada en concordancia con dicha prórroga o espera.

IV. Que para cancelar la fianza, será requisito indispensable la solicitud expresa y por escrito de **“EL CONTRATANTE”**.

V. Que la institución afianzadora acepte expresamente someterse a lo preceptuado en los Artículos 279, 280, 179 y 289 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas en vigor.

VI. Que estará vigente hasta que las obras, materia de **“EL CONTRATO”** hayan sido recibidas oficialmente en su totalidad por **“EL CONTRATANTE”** y dentro de los 15 (quince) días hábiles siguientes a dicha recepción formal, deberá sustituirse esta fianza por otra equivalente al 20 % (veinte por ciento) del monto total ejercido, para responder de los defectos, de vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en su ejecución, la cual tendrá vigencia de 2 años, contados a partir de la fecha de terminación de los trabajos, aceptando expresamente la compañía afianzadora de que al no entregar **“EL CONTRATISTA”** la nueva póliza de fianza, la presente continuará vigente, y durante los dos años siguientes a la recepción para responder, tanto de los posibles defectos de construcción, vicios ocultos, como de cualquier responsabilidad que resultare a cargo de **“EL CONTRATISTA”**, derivado del incumplimiento de **“EL CONTRATO”**. En este caso, la fianza continuará vigente hasta que **“CONTRATISTA”** corrija los defectos y satisfaga las responsabilidades.

VII. Que permanecerá en vigor durante la sustanciación de todos los recursos o juicios que se interpongan hasta que se dicte resolución definitiva de la autoridad competente.



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA,
ESTADO DE CAMPECHE
PERÍODO 2021- 2024
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO



C) GARANTÍA PARA RESPONDER DE OBRA MAL EJECUTADA O VICIOS OCULTOS.

I. **"EL CONTRATISTA"** garantizará los trabajos dentro de los quince días naturales anteriores a la recepción formal de los mismos, sustituyendo la fianza vigente de cumplimiento mediante fianza equivalente de un veinte por ciento del monto total ejercido de la obra, para responder de los defectos que resulten de la realización de los mismos, de vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en su ejecución, esta garantía tendrá una vigencia de dos años contados a partir de la fecha de entrega-recepción de los trabajos.

NOVENA: RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS.

La recepción de los trabajos, ya sea total o parcial, se realizará conforme a lo señalado en los requisitos y plazos que para tal efecto establece la Ley de Obras Públicas del Estado de Campeche, así como bajo las modalidades que la misma ley prevé, reservándose **"EL CONTRATANTE"** el derecho de reclamar los trabajos faltantes o mal ejecutados.

"EL CONTRATANTE" podrá efectuar recepciones parciales cuando a su juicio existieren trabajos terminados y sus partes sean identificables y susceptibles de utilizarse.

DÉCIMA: EJECUCIÓN DE OBRA ADICIONAL O EXTRAORDINARIA.

Si durante la vigencia del contrato, **"EL CONTRATISTA"** se percata de la necesidad de ejecutar cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catálogo original del contrato, deberá notificarlo a **"EL CONTRATANTE"**, para que éste resuelva lo conducente. **"EL CONTRATISTA"** solo podrá ejecutarlos una vez que cuente con la autorización por escrito o en la bitácora, por parte de la residencia de obra, salvo que se trate de situaciones de emergencia en la que no sea posible esperar su autorización.

"EL CONTRATANTE" deberá asegurarse de contar con los recursos disponibles y suficientes dentro de su presupuesto autorizado. Por su parte, **"EL CONTRATISTA"** ampliará la garantía otorgada para el cumplimiento del contrato, en la misma proporción de los trabajos adicionales.

Si **"EL CONTRATISTA"** realiza trabajos por mayor valor del contratado, sin mediar autorización por escrito de **"EL CONTRATANTE"**, independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecución de los trabajos excedentes, no tendrá derecho a reclamar pago alguno por ello ni modificación alguna al plazo de ejecución de los trabajos.

DÉCIMA PRIMERA: REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA.

"EL CONTRATISTA" se obliga a establecer anticipadamente a la iniciación de los trabajos en el sitio de realización de los mismos, un representante que obrará como superintendente de construcción, el cual deberá tener poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato.

"EL CONTRATANTE" se reserva el derecho de su aceptación, el cual se podrá ejercer en cualquier tiempo.



DÉCIMA SEGUNDA: RELACIONES LABORALES.

Con excepción de las obligaciones derivadas de **"EL CONTRATO"**, **"LAS PARTES"** convienen que el personal comisionado por cada una de ellas para la realización del objeto materia de **"EL CONTRATO"**, se entenderá relacionado exclusivamente con aquella que lo empleó. Por ende, asumirá su responsabilidad de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social y en ningún caso serán consideradas como patrones solidarios o sustitutos, por no ser aplicables lo dispuesto en la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Poderes, Municipios e Instituciones Descentralizadas del Estado de Campeche, en vigor; ni la Ley Federal del Trabajo conforme a su Artículo 1º; por tal razón y para los efectos a que haya lugar, **"EL PRESTADOR"** no será considerado como trabajador de **"EL CONTRATANTE"**.

DÉCIMA TERCERA: RESPONSABILIDADES DE "EL CONTRATISTA".

"EL CONTRATISTA" se obliga a que los materiales y equipo que se utilicen en los trabajos objeto de la obra motivo de este contrato, cumplan con las normas de calidad establecidas en el anexo de este contrato y a que la realización de todas y cada una de las partes de dicha obra se efectúen a satisfacción de **"EL CONTRATANTE"**, así como a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos de la misma y de los daños y perjuicios, que por inobservancia o negligencias de su parte se lleguen causar a **"EL CONTRATANTE"** o a terceros, en cuyo caso se hará efectiva la garantía otorgada para el efecto, por el monto total de la misma.

"EL CONTRATISTA" de conformidad con el Artículo 32 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Estado de Campeche no podrá ceder a terceras personas físicas o morales sus derechos y obligaciones derivadas de este contrato y sus anexos, salvo los derechos de cobro sobre las estimaciones por los trabajos ejecutados que amparan este contrato sin previa aprobación expresa y por escrito de **"EL CONTRATANTE"**, en los términos de la Ley de Adquisiciones y de la Ley de obras públicas del Estado de Campeche.

DÉCIMA CUARTA: PENAS CONVENCIONALES.

"EL CONTRATANTE" tendrá la facultad de verificar que los trabajos objeto de este contrato se estén ejecutando por **"EL CONTRATISTA"** de acuerdo con el programa de obras aprobado, para lo cual **"EL CONTRATANTE"** comparará periódicamente el avance de los trabajos. Si como consecuencia de la comparación a que se refiere el párrafo anterior el avance es menor de lo que debió realizarse a la fecha de la verificación, **"EL CONTRATANTE"** hará efectiva la fianza por incumplimiento de contrato.

La sanción por atraso se hará efectiva hasta la fecha de terminación total de los trabajos programados, hasta por un monto del 2.00% del total de los trabajos no ejecutados, en tanto no ocurra tendrá el carácter de retención y podrá ser devolutiva si el atraso se recupera dentro del plazo de ejecución acordado.

"EL CONTRATANTE" verificará también la calidad de los trabajos. Cuando estos no se hubieren apegado a las normas y especificaciones respectivas, procederá a determinar la reposición de los trabajos mal ejecutados, o la aplicación de una deductiva en proporción a las deficiencias observadas, cuyo valor se hará efectivo en la siguiente estimación. Si se determina la reposición, se aplicará una retención del valor de los trabajos mal ejecutados, que solo se devolverá si **"EL CONTRATISTA"** cumple a satisfacción con los trabajos contratados.



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA,
ESTADO DE CAMPECHE
PERÍODO 2021- 2024
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO



“EL CONTRATISTA” se obliga al firmar el presente contrato a adquirir todos los materiales necesarios para la realización de los trabajos, dando preferencia a los proveedores establecidos en el Estado de Campeche.

Las penas convencionales anteriormente expuestas son independientes de la facultad que tiene “EL CONTRATANTE” para exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo.

DÉCIMA QUINTA: SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO

“EL CONTRATANTE” podrá suspender temporalmente, en todo o en parte la obra contratada en cualquier momento, por causas justificadas o por razones de interés general, sin que ello implique su terminación definitiva.

El presente contrato podrá continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha suspensión

DÉCIMA SEXTA: RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

“EL CONTRATANTE” podrá en cualquier momento rescindir administrativamente el presente contrato por incumplimiento de las obligaciones contraídas o por causas de interés general, previo aviso por escrito con quince días de anticipación, cuando se determine la suspensión de los trabajos o se rescinda el contrato por causas imputables a “EL CONTRATANTE”, éste pagará los trabajos ejecutados así como los gastos recuperables siempre que estos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el objeto de este contrato.

Además de las causas que la ley establece para la rescisión de este contrato, el mismo podrá ser rescindido por “EL CONTRATANTE” de pleno derecho y sin resolución judicial en caso de que “EL CONTRATISTA” incurra en alguna de las siguientes causales:

- I. Si no inicia los trabajos en la fecha pactada o no se ajusta en su ejecución al programa de trabajo aprobado.
- II. Se cede los derechos u obligaciones sin autorización previa y por escrito de “EL CONTRATANTE”.
- III. Si se declara en quiebra o suspensión de pagos o hace sesión de bien alguno en perjuicio de la obra.
- IV. Si suspende la ejecución de los trabajos sin causa justificada o se niega a reparar o reponer parte alguna que haya sido rechazada por el control de calidad.
- V. Si incumple con lo pactado en este contrato, respecto de las aportaciones de maquinaria, herramientas y personal competente o la residencia de la obra.
- VI. Si no atiende de inmediato las relaciones obrero – patronales, a su cargo.
- VII. Si no atiende a las indicaciones de los programas de trabajo.
- VIII. Si deja de presentar estimaciones de obra ejecutada por más de 30 días.
- IX. Si incumple con alguna de las obligaciones a su cargo expresamente establecidas en este contrato.



X. Si incumple con sus obligaciones fiscales.

XI. El incumplimiento de "EL CONTRATISTA" al otorgamiento de la fianza, siendo a su cargo los daños y perjuicios que pudiera sufrir "EL CONTRATANTE" por la inejecución de los trabajos pactados.

Si "EL CONTRATANTE" considera que "EL CONTRATISTA" ha incurrido en alguna de las causales de rescisión lo comunicará al mismo para que dentro de los términos de ley exponga lo que a su derecho convenga; en caso de no manifestar nada en su defensa o si las razones aducidas no son de la satisfacción de "EL CONTRATANTE" operará plenamente la rescisión con todas sus consecuencias jurídicas respectivas.

DÉCIMA SÉPTIMA: MODIFICACIONES.

El presente "CONTRATO" sólo podrá ser modificado y/o adicionado mediante la firma del CONTRATO Modificatorio o Addendum correspondiente.

DÉCIMA OCTAVA: NORMATIVIDAD

I. **Supervisión de los trabajos.** "EL CONTRATANTE" por conducto de su residente de supervisión, que para tal efecto designe, tendrá la facultad de supervisar, vigilar, controlar y revisar los trabajos objeto de este contrato y dar a "EL CONTRATISTA" por escrito, las instrucciones que estime pertinentes, relacionadas con su ejecución en la forma convenida y con las modificaciones que en este caso ordene.

II. Es facultad de "el contratante" realizar la inspección de todos los materiales que vayan a usarse en la ejecución de los trabajos ya sea en el sitio de éstos o en los lugares de adquisición o de fabricación.

III. **Bitácora.**- "EL CONTRATANTE" a través de su residente de supervisión llevará una bitácora de obra que contenga al día toda la información respecto al desarrollo de los trabajos determinando el avance de los mismos, así como el pago de las estimaciones realizadas, suspensiones y otras circunstancias que se le presenten durante la ejecución, desde la fecha de iniciación, hasta la conclusión, debiendo ser firmada dicha bitácora por los representantes de obra designados por las partes.

IV. **Equipo.** "EL CONTRATISTA" se obliga a mantener el equipo indispensable para la realización de la obra, en buenas condiciones de uso y disponibilidad, en el sitio de la realización de la misma.

DÉCIMA NOVENA: COMUNICACIONES.

Las comunicaciones referentes a cualquier aspecto de este "CONTRATO", se deberán dirigir a los domicilios señalados en el apartado de declaraciones.

VIGÉSIMA: ENCABEZADOS Y DEFINICIONES.

Los encabezados y definiciones contenidos en este documento se han utilizado por conveniencia, brevedad y para fácil identificación de cláusulas y términos y en ningún momento se entenderá que dichos encabezados y definiciones limitan o alteran el acuerdo de las partes contenido en el clausulado del presente "CONTRATO".



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA,
ESTADO DE CAMPECHE
PERÍODO 2021- 2024
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO



VIGÉSIMA PRIMERA: COMPETENCIA Y JURISDICCIÓN.

Las partes manifiestan que el presente "CONTRATO" es producto de la buena fe, por lo que realizarán todas las acciones que estén a su alcance y sean inherentes a su cumplimiento, así mismo manifiestan que están de acuerdo que rijan todas y cada una de las cláusulas expresamente pactadas en este "CONTRATO"; sin embargo, en caso de que existan controversias las partes convienen que se sujetaran a los Tribunales Jurisdiccionales de la materia establecidos en el Estado de Campeche para conocer de cualquier juicio o reclamación derivado del mismo, renunciando a cualquier competencia o fuero que pudiera corresponderles por razón de su domicilio presente o futuro.

Leído que fue por las partes el presente contrato y aceptando su contenido y alcance legal, se firma en dos ejemplares, en La Ciudad de Candelaria, Municipio del mismo nombre, Estado de Campeche, a los 19 día del mes de **septiembre** del año Dos Mil **veintidós**, quedando un ejemplar en poder de "EL CONTRATISTA", y otro en poder de "EL CONTRATANTE".

**POR LA CONTRATANTE
MUNICIPIO DE CANDELARIA**


**LIC. FRANCISCO JAVIER FARIAS BAILON
PRESIDENTE MUNICIPAL**


**ING. JULIO CESAR BORJAS ZUÑIGA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
Y DESARROLLO URBANO**


**L.A.F. INDIRA PATRICIA TACU PEREZ
TESORERA MUNICIPAL**

POR EL CONTRATISTA

C. CARLOS DE JESUS ORTEGA ALVAREZ


**C. CARLOS DE JESUS ORTEGA ALVAREZ
REPRESENTANTE LEGAL**

TESTIGOS


**LIC. ISRAEL SAID ELIZALDE JIMENEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN**

Hoja No. 13



**H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA,
ESTADO DE CAMPECHE
PERÍODO 2021- 2024
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO**



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

En la ciudad de Candelaria, Campeche, siendo las **13:00** horas del día **6 de septiembre de 2022**, en las oficinas de la sala de juntas de presidencia del H. Ayuntamiento del Municipio de Candelaria, ubicada en la Av. 1ero. de julio s/n., entre 15 y 17, Col. centro, se reunieron las personas cuyos nombres, cargos y firmas aparecen al margen y calce de este documento, para celebrar la junta de aclaraciones del concurso No. **MCA/DOPDU/FAISM-SJ-01/2022**, relativo a la **CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA LOCALIDAD ALIANZA PRODUCTORA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA**, de la localidad de **ALIANZA PRODUCTORA**.

En primera instancia el **Ing. Julio César Borjas Zúñiga**, Director de obras Públicas y Desarrollo Urbano del Municipio de Candelaria, en nombre y representación del **Lic. Francisco Javier Farías Bailón**, Presidente Municipal, solicito a los participantes externar sus preguntas.

PREGUNTA.- ¿SE ENTREGARAN FORMATOS ESPECIFICOS PARA LA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS SOLICITADOS EN PROPUESTA TÉCNICA Y ECONOMICA?

RESPUESTA.- SI, SE LES HACE ENTREGA DE LOS ESCRITOS DE PROPUESTA TÉCNICA Y LEGAL EN FORMATO EDITABLE WORD Y LOS DOCUMENTOS PARA PRESENTAR DE LA PROPUESTA ECONOMICA EN FORMATO PDF.

La firma de la presente acta servirá de acuse de recibido de los formatos entregados para la presentación de las propuestas del procedimiento de concurso.

No existiendo más preguntas por parte de los licitantes, El **Ing. Julio César Borjas Zúñiga** les informa que:

Las empresas licitantes deberán presentar la siguiente información en el acto de apertura económica en medios digitales editables y en formato Excel.

- Explosión de insumos
- Catálogo de Conceptos

Dicha información podrán entregarlo en CD-ROM dentro del sobre del paquete económico.

Para constancia de este acto y los efectos legales correspondientes, firman el presente documento las personas que participan en la misma a las **13:30** horas del mismo día.

FUNCIONARIOS

Ing. Julio César Borjas Zúñiga.

Director de Obras Públicas y Desarrollo Urbano del Municipio de Candelaria.

Lic. Israel Said Elizalde Jiménez.

Director de Planeación del Municipio de Candelaria.

L.A.F. Indira Patricia Tacú Pérez.

Tesorera Municipal del Municipio de Candelaria.





H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA,
ESTADO DE CAMPECHE
PERÍODO 2021- 2024
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

L. en D. Martha Victoria Caballero Lugo.
Titular del Órgano Interno de Control del Municipio de Candelaria.

PARTICIPANTES

EMPRESA	REPRESENTANTE	FIRMA
1 C. LIZBETH PERALES BAUTISTA.	C. LIZBETH PERALES BAUTISTA.	
2 PROINHER, S.A. DE C.V.	C. LAURA IVET ZAMORANO PAREDES.	
3 C. CARLOS DE JESUS ORTEGA ALVAREZ.	C. CARLOS DE JESUS ORTEGA ALVAREZ.	

ESTAS FIRMAS CORRESPONDEN AL ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL
CONCURSO No. MCA/DOPDU/FAISM-SJ-01/2022.



ACTA DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS

En la ciudad de Candelaria, Campeche siendo las 9:00 horas del día 13 de septiembre de 2022, se reunieron en la Sala de Juntas del Cabildo del H. Ayuntamiento de Candelaria, ubicado en la Av. 1ero. de Julio S/N., entre 15 y 17, Colonia Centro, C.P. 24330, los representantes de las dependencias convocadas y las compañías invitadas para la recepción de los sobres cerrados que contienen las propuestas técnicas y económicas de cada uno de los participantes en la **Invitación restringida a cuando menos tres personas** relativa al **Concurso No. MCA/DOPDU/FAISM-SJ-01/2022** de la obra:

CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA LOCALIDAD ALIANZA PRODUCTORA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA, EN LA LOCALIDAD DE: ALIANZA PRODUCTORA.

El presente acto es presidido por el **Ing. Julio Cesar Borjas Zúñiga**, Director de Obras Públicas y Desarrollo Urbano del Municipio de Candelaria, quien es acompañado por diversos servidores públicos que forman parte integrante del **grupo de evaluación técnico-económico** del presente concurso, mismos que aparecen en la lista de asistencia que forma parte de la presente acta.

Se hace mención y pide a los contratistas que manifiesten si las propuestas que el día de hoy entregan a esta dependencia son propuestas conjuntas o no, a lo que los invitados manifiestan en voz de sus representantes de **NO** participar en ninguno de los casos con propuestas conjuntas.

El **Ing. Julio Cesar Borjas Zúñiga** verificó la lista de asistencia y el número de compañías constructoras invitadas que presentaron los sobres cerrados que contienen sus propuestas técnicas y económicas.

A continuación, el **Ing. Julio Cesar Borjas Zúñiga**, los servidores públicos y representantes de las compañías invitadas proceden a rubricar los sobres que contienen las propuestas económicas, los cuales quedarán en custodia del H. Ayuntamiento del Municipio de Candelaria para el siguiente evento ya sean aceptadas y/o desechadas sus propuestas técnicas.

Se procede a la apertura de los sobres que contienen las propuestas técnicas y a revisar en forma cuantitativa que cada una de las propuestas contenga los documentos solicitados.

A continuación, se señala el nombre de las compañías invitadas cuyas **propuestas fueron aceptadas** para su análisis cualitativo por el **grupo de evaluación técnico-económico** del H. Ayuntamiento del Municipio de Candelaria, siendo las siguientes:

Pág. 1/3



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA,
ESTADO DE CAMPECHE
PERÍODO 2021- 2024
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO



Empresas que fueron aceptadas sus propuestas técnicas para revisión cualitativa	Nombre del representante
C. LIZBETH PERALES BAUTISTA.	C. LIZBETH PERALES BAUTISTA.
PROINHER, S.A. DE C.V.	C. LAURA IVET ZAMORANO PAREDES.
C. CARLOS DE JESUS ORTEGA ALVAREZ.	C. CARLOS DE JESUS ORTEGA ALVAREZ.

El **Ing. Julio Cesar Borjas Zúñiga** hace recordatorio que, de acuerdo al calendario de concurso, la apertura de **propuestas Económicas** se llevará a cabo hoy mismo a las **9:30 hrs.** en la Sala de Juntas del Cabildo del H. Ayuntamiento de Candelaria, con domicilio en Av. 1ero. de Julio S/N., entre 15 y 17, Colonia Centro, C.P. 24330, Candelaria, Campeche.

A continuación firman los representantes de las compañías invitadas y personas que asistieron al presente acto, señalando que se pone a su disposición la presente Acta y expresando que la falta de firma de algún representante **no invalida** el contenido ni efectos de la misma.

FUNCIONARIOS

Ing. Julio Cesar Borjas Zúñiga

Director de Obras Públicas y Desarrollo Urbano del Municipio de Candelaria.

Lic. Israel Said Elizalde Jiménez

Director de Planeación del Municipio de Candelaria.


L.A.F. Indira Patricia Tacú Pérez

Tesorera Municipal del Municipio de Candelaria.

L. en D. Martha Victoria Caballero Lugo

Titular del Órgano Interno de Control del Municipio de Candelaria.

Pág. 2/3





**H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA,
ESTADO DE CAMPECHE
PERÍODO 2021- 2024
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO**



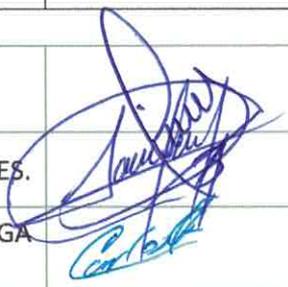
M.I. Manuel Arturo Kú Cob
Subdirector de Obras Públicas y
Desarrollo Urbano

Ing. Luis Armando Canche Tún
Jefe de Departamento de Costos.

Ing. Ansoni Daniel Jiménez Canul
Jefe de Departamento de Supervisión.



PARTICIPANTES

EMPRESA	REPRESENTANTE	FIRMA
1 C. LIZBETH PERALES BAUTISTA.	C. LIZBETH PERALES BAUTISTA.	
2 PROINHER, S.A. DE C.V.	C. LAURA IVET ZAMORANO PAREDES.	
3 C. CARLOS DE JESUS ORTEGA ALVAREZ.	C. CARLOS DE JESUS ORTEGA ALVAREZ.	



**ESTAS FIRMAS CORRESPONDEN AL
ACTA DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y APERTURA DE PROPUESTAS
TÉCNICAS CONCURSO No. MCA/DOPDU/ FAISM-SJ-01/2022**





ACTA DE LA APERTURA DE PROPUESTAS ECONÓMICAS

En la ciudad de Candelaria del municipio de Candelaria Campeche, siendo las 9:30 horas del día 13 de septiembre de 2022, se reúnen en la Sala de Juntas del Cabildo del H. Ayuntamiento de Candelaria, ubicado en la Av. 1ero. de Julio S/N., entre 15 y 17, Colonia Centro, C.P. 24330, los representantes de las dependencias convocadas y las compañías invitadas para la apertura de los sobres que contienen las propuestas económicas de cada uno de las compañías que fueron admitidos en la **Invitación a cuando menos tres contratistas** relativa al **Concurso No. MCA/DOPDU/FAISM-SJ-01/2022** de la obra:

CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA LOCALIDAD ALIANZA PRODUCTORA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA, EN LA LOCALIDAD DE: ALIANZA PRODUCTORA.

El presente acto es presidido por el **Ing. Julio César Borjas Zúñiga**, Director de Obras Públicas y Desarrollo Urbano del Municipio de Candelaria, quien es acompañado por diversos servidores públicos que forman parte integrante del **grupo de evaluación técnico-económico** del presente concurso, mismos que aparecen en la lista de asistencia que forma parte de la presente acta.

El **Ing. Julio César Borjas Zúñiga**, de conformidad con la Ley de Obras Públicas del Estado de Campeche, procedió a informar que se realizó la evaluación de las propuestas técnicas aceptadas y dio a conocer el resultado de las compañías invitadas que cumplieron con las condiciones legales y técnicas.

Propuestas técnicas aceptadas	Asiste por la empresa
C. LIZBETH PERALES BAUTISTA.	C. LIZBETH PERALES BAUTISTA.
PROINHER, S.A. DE C.V.	C. LAURA IVET ZAMORANO PAREDES.
C. CARLOS DE JESUS ORTEGA ALVAREZ.	C. CARLOS DE JESUS ORTEGA ALVAREZ.

A continuación el **Ing. Julio César Borjas Zúñiga** procedió a la apertura de las propuestas económicas de las compañías invitadas cuyas propuestas técnicas no fueron desechadas y dio lectura al importe total de las propuestas que cubren los requisitos exigidos, mismas que se turnarán para su análisis cualitativo por las áreas designadas del Municipio.

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA,
ESTADO DE CAMPECHE
PERÍODO 2021- 2024
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO



Compañía que se acepta su propuesta económica	Asiste por la empresa
C. LIZBETH PERALES BAUTISTA.	C. LIZBETH PERALES BAUTISTA.
PROINHER, S.A. DE C.V.	C. LAURA IVET ZAMORANO PAREDES.
C. CARLOS DE JESUS ORTEGA ALVAREZ.	C. CARLOS DE JESUS ORTEGA ALVAREZ.

Conforme a la Ley de Obras Públicas del Estado de Campeche, se mencionan a continuación a los participantes cuyas propuestas económicas fueron aceptadas en la revisión cuantitativa:

Compañía	Importe con IVA
C. LIZBETH PERALES BAUTISTA.	\$ 1,418,749.30
PROINHER, S.A. DE C.V.	\$ 1,434,297.69
C. CARLOS DE JESUS ORTEGA ALVAREZ.	\$ 1,399,476.50 ✓

Enseguida un representante de las compañías invitadas y dos servidores públicos municipales presentes procedieron a rubricar el documento de la propuesta económicas denominado **Catálogo de conceptos**, en el que se consignan descripción, unidades de medición, cantidades de obra, precio unitario en número y letra, e importes por partidas así como sumas parciales y acumulados por hoja.

El Ing. **Julio César Borjas Zúñiga**, Director de Obras Públicas y Desarrollo Urbano señala que el día **15 de septiembre de 2022** a las **9:00 hrs.** se celebrará el **acto de fallo** de la presente Invitación, en la Sala de Juntas del Cabildo del H. Ayuntamiento de Candelaria, Av. 1ero. de Julio S/N., entre 15 y 17, Colonia Centro, C.P. 24330.

A continuación, firman los representantes de las compañías invitadas y personas que asistieron al presente acto, señalando que se pone a disposición la presente acta y expresando que la falta de firma de algún invitado no invalida el contenido ni efectos de la misma.

Pág. 2/3



**H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA,
ESTADO DE CAMPECHE
PERÍODO 2021- 2024
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO**



FUNCIONARIOS

Ing. Julio Cesar Borjas Zúñiga

Director de Obras Públicas y Desarrollo Urbano del Municipio de Candelaria.

Lic. Israel Said Elizalde Jiménez

Director de Planeación del Municipio de Candelaria.

L.A.F. Indira Patricia Tacú Pérez

Tesorera Municipal del Municipio de Candelaria.

L. en D. Martha Victoria Caballero Lugo

Titular del Órgano Interno de Control del Municipio de Candelaria.

M.I. Manuel Arturo Kú Cob

Subdirector de Obras Públicas y Desarrollo Urbano.

Ing. Luis Armando Canche Tún

Jefe de Departamento de Costos.

Ing. Ansoni Daniel Jiménez Canul

Jefe de Departamento de Supervisión.

INVITADOS

EMPRESA	REPRESENTANTE	FIRMA
1 C. LIZBETH PERALES BAUTISTA.	C. LIZBETH PERALES BAUTISTA.	
2 PROINHER, S.A. DE C.V.	C. LAURA IVET ZAMORANO PAREDES.	
3 C. CARLOS DE JESUS ORTEGA ALVAREZ.	C. CARLOS DE JESUS ORTEGA ALVAREZ.	

**ESTAS FIRMAS CORRESPONDEN AL ACTA DE LA APERTURA DE PROPUESTAS
ECONÓMICAS, CONCURSO No. MCA/DOPDU/ FAISM-SJ-01/2022.**





**H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA,
ESTADO DE CAMPECHE
PERÍODO 2021- 2024
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO**



Dictamen Técnico

Concurso: MCA/DOPDU/ FAISM-SJ-01/2022.

CONCEPTOS

Nº	LICITANTES	AT1	AT2	AT3	AT4	AT5	AT6	AT7	AT8
		DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACION INTEGRAL PARA REALIZAR TRABAJOS (MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA OBRA) INCLUYENDO EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCION DE TRABAJOS.	DECLARACIÓN MEDIANTE EL CUAL EL LICITANTE DECLARE QUE NO SE ENCUENTRA EN LOS SUPUESTOS QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 51 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y/O ART. 34 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE CAMPECHE.	DECLARACION ESCRITA DE CONOCER EL SITIO DE REALIZACION DE LOS TRABAJOS Y SUS CONDICIONES AMBIENTALES	DECLARACION DE HABER ASISTIDO O NO A LAS JUNTAS DE ACLARACIONES, ASI COMO DE HABER CONSIDERADO LAS MODIFICACIONES QUE, EN SU CASO, SE HAYAN EFECTUADO A LAS BASES DE LICITACION.	DECLARACION ESCRITA EN LA QUE SE SEÑALE LAS PARTES DE LOS TRABAJOS QUE NO SE SUBCONTRATARA.	DECLARACION ESCRITA CONOCER EL CONTENIDO DEL MODELO DE CONTRATO Y SU CONFORMIDAD DE AJUSTARSE A SUS TERMINOS.	DECLARACION DE NO TENER ADEUDOS DEL FISCAL	DOCUMENTACION QUE ACREDITE LA EXPERIENCIA DE LA EMPRESA, IDENTIFICACION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL LICITANTE Y SU PERSONAL QUE ACREDITEN LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TECNICA REQUERIDA Y RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.
1.-	C. LIZBETH PERALES BAUTISTA.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
2.-	PROINHER, S.A. DE C.V.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
3.-	C. CARLOS DE JESUS ORTEGA ALVAREZ.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI

ING. JULIO CESAR BÓRRIAS ZUÑIGA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO.



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA,
ESTADO DE CAMPECHE
PERÍODO 2021- 2024
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO



Dictamen Técnico
Concurso: MCA/DOPDU/ FAISM-SJ-01/2022.

POSTOR: C. LIZBETH PERALES BAUTISTA.

DOCUMENTO	OBSERVACION	CALIFICACION
ANEXO 1	DESCRIPCION DE LA PLANEACION INTEGRAL DEL LICITANTE PARA REALIZAR LOS TRABAJOS (MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA OBRA) INCLUYENDO EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	SI
ANEXO 2	DECLARACIÓN ESCRITA MEDIANTE EL CUAL DECLARE QUE NO SE ENCUENTRA EN LOS SUPUESTOS QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 51 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y/O ART. 34 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE CAMPECHE.	SI
ANEXO 3	DECLARACION ESCRITA DE CONOCER EL SITIO DE REALIZACION DE LOS TRABAJOS Y SUS CONDICIONES AMBIENTALES	SI
ANEXO 4	DECLARACION ESCRITA DE HABER ASISTIDO O NO A LAS JUNTAS DE ACLARACIONES, ASI COMO DE HABER CONSIDERADO LAS MODIFICACIONES QUE, EN SU CASO, SE HAYAN EFECTUADO A LAS BASES DE LICITACION.	SI
ANEXO 5	DECLARACION ESCRITA EN LA QUE SEÑALE LAS PARTES DE LOS TRABAJOS QUE NO SUBCONTRATARA.	SI
ANEXO 6	DECLARACION ESCRITA DE CONOCER EL CONTENIDO DEL MODELO DEL CONTRATO Y SU CONFORMIDAD DE AJUSTARSE A SUS TERMINOS.	SI
ANEXO 7	DECLARACION ESCRITA DE NO TENER ADEUDOS FISCALES	SI
ANEXO 8	DOCUMENTACION QUE ACREDITE LA EXPERIENCIA DE LA EMPRESA, IDENTIFICACION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL LICITANTE Y SU PERSONAL QUE ACREDITEN LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TECNICA REQUERIDA Y RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.	SI



ING. JULIO CESAR BORJAS ZUÑIGA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO.





H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA,
ESTADO DE CAMPECHE
PERÍODO 2021- 2024
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO



Dictamen Técnico
Concurso: MCA/DOPDU/ FAISM-SJ-01/2022.

POSTOR: PROINHER, S.A. DE C.V.

DOCUMENTO	OBSERVACION	CALIFICACION
ANEXO 1	DESCRIPCION DE LA PLANEACION INTEGRAL DEL LICITANTE PARA REALIZAR LOS TRABAJOS (MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA OBRA) INCLUYENDO EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	SI
ANEXO 2	DECLARACIÓN ESCRITA MEDIANTE EL CUAL DECLARE QUE NO SE ENCUENTRA EN LOS SUPUESTOS QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 51 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y/O ART. 34 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE CAMPECHE.	SI
ANEXO 3	DECLARACION ESCRITA DE CONOCER EL SITIO DE REALIZACION DE LOS TRABAJOS Y SUS CONDICIONES AMBIENTALES	SI
ANEXO 4	DECLARACION ESCRITA DE HABER ASISTIDO O NO A LAS JUNTAS DE ACLARACIONES, ASI COMO DE HABER CONSIDERADO LAS MODIFICACIONES QUE, EN SU CASO, SE HAYAN EFECTUADO A LAS BASES DE LICITACION.	SI
ANEXO 5	DECLARACION ESCRITA EN LA QUE SEÑALE LAS PARTES DE LOS TRABAJOS QUE NO SUBCONTRATARA.	SI
ANEXO 6	DECLARACION ESCRITA DE CONOCER EL CONTENIDO DEL MODELO DEL CONTRATO Y SU CONFORMIDAD DE AJUSTARSE A SUS TERMINOS.	SI
ANEXO 7	DECLARACION ESCRITA DE NO TENER ADEUDOS FISCALES	SI
ANEXO 8	DOCUMENTACION QUE ACREDITE LA EXPERIENCIA DE LA EMPRESA, IDENTIFICACION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL LICITANTE Y SU PERSONAL QUE ACREDITEN LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TECNICA REQUERIDA Y RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.	SI

ING. JULIO CESAR BORJAS ZUÑIGA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO.



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA,
ESTADO DE CAMPECHE
PERÍODO 2021- 2024
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO



Dictamen Técnico
Concurso: MCA/DOPDU/ FAISM-SJ-01/2022.

POSTOR: C. CARLOS DE JESUS ORTEGA ALVAREZ.

DOCUMENTO	OBSERVACION	CALIFICACION
ANEXO 1	DESCRIPCION DE LA PLANEACION INTEGRAL DEL LICITANTE PARA REALIZAR LOS TRABAJOS (MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA OBRA) INCLUYENDO EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	SI
ANEXO 2	DECLARACIÓN ESCRITA MEDIANTE EL CUAL DECLARE QUE NO SE ENCUENTRA EN LOS SUPUESTOS QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 51 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y/O ART. 34 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE CAMPECHE.	SI
ANEXO 3	DECLARACION ESCRITA DE CONOCER EL SITIO DE REALIZACION DE LOS TRABAJOS Y SUS CONDICIONES AMBIENTALES	SI
ANEXO 4	DECLARACION ESCRITA DE HABER ASISTIDO O NO A LAS JUNTAS DE ACLARACIONES, ASI COMO DE HABER CONSIDERADO LAS MODIFICACIONES QUE, EN SU CASO, SE HAYAN EFECTUADO A LAS BASES DE LICITACION.	SI
ANEXO 5	DECLARACION ESCRITA EN LA QUE SEÑALE LAS PARTES DE LOS TRABAJOS QUE NO SUBCONTRATARA.	SI
ANEXO 6	DECLARACION ESCRITA DE CONOCER EL CONTENIDO DEL MODELO DEL CONTRATO Y SU CONFORMIDAD DE AJUSTARSE A SUS TERMINOS.	SI
ANEXO 7	DECLARACION ESCRITA DE NO TENER ADEUDOS FISCALES	SI
ANEXO 8	DOCUMENTACION QUE ACREDITE LA EXPERIENCIA DE LA EMPRESA, IDENTIFICACION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL LICITANTE Y SU PERSONAL QUE ACREDITEN LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TECNICA REQUERIDA Y RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.	SI



ING. JULIO CESAR BORJAS ZUÑIGA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO.





H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA,
ESTADO DE CAMPECHE
PERÍODO 2021- 2024
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO



Dictamen Económico que emite el H. Ayuntamiento de Candelaria a través de la Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, en relación a la licitación No. MCA/DOPDU/FAISM-SJ-01/2022.

Relativa a CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA LOCALIDAD ALIANZA PRODUCTORA
DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA,
EN LA LOCALIDAD DE ALIANZA PRODUCTORA.

Efectuado el análisis en forma minuciosa de las proposiciones recibidas, conforme se estipula en las bases y normas para la contratación y ejecución de obras públicas, el artículo 35 de la Ley de Obras Públicas del Estado y artículo 27 y 28 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Estado se dictamina que la postura presentada por:

A).- **C. CARLOS DE JESUS ORTEGA ALVAREZ.-** Con un importe original de \$ 1,399,476.50 C/I.V.A. y una vez verificadas las operaciones aritméticas resulta de \$ 1,3299,476.50 C/I.V.A. esta proposición cumple con todos los requisitos y documentos solicitados en las bases de licitación, el programa de ejecución que propone resulta factible de realizar con los recursos considerados por el contratista; los salarios son normales; los precios de insumos son bajos; los costos horarios de maquinaria y equipo son bajos.

CONCLUSION: La proposición de esta empresa resulta aceptable y corresponde a la postura solvente más baja.

B).- **C. LIZBETH PERALES BAUTISTA.-** Con un importe original de \$ 1,418,749.30 C/I.V.A. y una vez verificadas las operaciones aritméticas resulta de \$ 1,418,7498.30 C/I.V.A. esta proposición cumple con todos los requisitos y documentos solicitados en las bases de licitación, el programa de ejecución que propone resulta factible de realizar con los recursos considerados por el contratista, los salarios son normales; los precios de insumos son altos; los costos horarios de maquinaria y equipo son altos.

CONCLUSION: La proposición de esta empresa resulta aceptable y corresponde al segundo lugar.

C).- **PROINHER, S.A. DE C.V.-** Con un importe original de \$ 1,434,297.69 C/I.V.A. y una vez verificadas las operaciones aritméticas resulta de \$ 1,434,297.69 C/I.V.A. esta proposición cumple con todos los requisitos y documentos solicitados en las bases de licitación, el programa de ejecución que propone resulta factible de realizar con los recursos considerados por el contratista, los salarios son normales; los precios de insumos son altos; los costos horarios de maquinaria y equipo son altos.

CONCLUSION: La proposición de esta empresa resulta aceptable y corresponde al tercer lugar.


Candelaria, Campeche, a 15 de septiembre de 2022.

Director de Obras Públicas
y Desarrollo Urbano.

Ing. Julio César Borjas Zúñiga

 <p>H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA, ESTADO DE CAMPECHE PERIODO 2021-2024 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO</p>		<p>RESUMEN DEL ANALISIS DE LAS PROPOSICIONES RECIBIDAS</p> <p>OBRA: CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA LOCALIDAD ALIANZA PRODUCTORA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA</p>		<p>CONCURSO No. MCA/DOPDUJ/FAISM-SI-01/2022 PRESUPUESTO BASE \$ 1,404,434.21 C/IVA 19/11/2022</p>	
<p>CONCURSANTE:</p>		<p>C. CARLOS DE JESUS ORTA ALVAREZ.</p>		<p>C. LIZBETH PERALES BAUTISTA.</p>	
<p>LUGAR</p>		<p>PRIMERO</p>		<p>TERCERO</p>	
<p>IMPORTE ORIGINAL</p>		<p>\$1,399,476.50 C/IVA</p>		<p>\$1,434,297.69 C/IVA</p>	
<p>PROPOSICION CORREGIDA</p>		<p>\$1,399,476.50 C/IVA</p>		<p>\$1,434,297.69 C/IVA</p>	
<p>DIF. C/PRESUPUESTO BASE</p>		<p>\$ 4,957.71</p>		<p>\$ (29,863.48)</p>	
<p>FECHA TERMINACION PROPUESTA</p>		<p>19-nov-22</p>		<p>19-nov-22</p>	
<p>PROGRAMA DE TRABAJO</p>					
<p>RELACION DE EQUIPO</p>					
<p>INDIRECTOS Y UTILIDADES</p>		<p>11.14%</p>		<p>11.07%</p>	
<p>DATOS BASICOS</p>		<p>\$576,811.25</p>		<p>\$566,393.60</p>	
<p>SALARIOS</p>		<p>\$373,513.35</p>		<p>\$392,802.31</p>	
<p>COSTOS H. EQUIPO</p>		<p>\$25,889.05</p>		<p>\$27,271.99</p>	
<p>ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS</p>		<p>Sus precios unitarios se encuentran bien estructurados e incluyen todos los cargos, sus rendimientos de equipo y personal que propone son altos. Propone 0.32% de financiamiento.</p>		<p>Sus precios unitarios se encuentran bien estructurados e incluyen todos los cargos, sus rendimientos de equipo y personal que propone son altos. Propone 0.32 de financiamiento.</p>	
<p>CONCLUSIONES:</p>		<p>LA PROPUESTA PRESENTADA POR C. CARLOS DE JESUS ORTEGA ALVAREZ, SE CONSIDERA LA MAS CONVENIENTE PARA EL H. AYUNTAMIENTO POR QUE REUNE LAS CONDICIONES NECESARIAS, CUMPLE CON LAS BASES DE LICITACION Y GARANTIZA SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y LA EJECUCION DE LA OBRA Y CORRESPONDE A LA SOLVENTE MAS BAJA.</p>			
		<p>OBSERVACIONES</p>			

CANDELARIA, CAMP. A 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022.

Director de Obras Públicas y Desarrollo Urbano

 Ing. Julio César Borrás Zuñiga



ACTA DE FALLO

En la ciudad de Candelaria del municipio de Candelaria Campeche, siendo las **9:00 hrs.** horas del día **15 de septiembre de 2022**, se reunieron en la Sala de Juntas del Cabildo del H. Ayuntamiento de Candelaria ubicado en Av. 1ero. de Julio S/N., ente 15 y 17, Colonia Centro, C. P. 24330, los representantes de las dependencias convocadas y los de las compañías invitadas para participar en el acto de fallo de la **Invitación a cuando menos tres personas** relativa al **Concurso No. MCA/DOPDU/FAISM-SJ-01/2022** de la obra:

CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA LOCALIDAD ALIANZA PRODUCTORA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA, EN LA LOCALIDAD DE: ALIANZA PRODUCTORA.

El presente acto es presidido por el **Ing. Julio Cesar Borjas Zúñiga**, Director de Obras Públicas y Desarrollo Urbano del Municipio de Candelaria, quien es acompañado por diversos servidores públicos municipales, los cuales aparecen en la lista de asistencia que forma parte de la presente acta.

El **Ing. Julio Cesar Borjas Zúñiga** procedió a dar lectura del resultado del dictamen que sirvió de base para dar el fallo y la compañía ganadora, (se acompaña copia del dictamen de fallo).

Después de haber realizado la evaluación económica de las propuestas presentadas al Municipio por las compañías invitada, el Municipio de Candelaria, por conducto de los servidores públicos de las áreas de la **Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano** representada por el **Ing. Julio Cesar Borjas Zúñiga**, decidieron dictaminar elegir como la propuesta solvente más baja a la presentada por la empresa: **C. CARLOS DE JESUS ORTEGA ALVAREZ**, con un monto de \$ **1,399,476.50** son: **(Un millón trescientos noventa y nueve mil cuatrocientos setenta y seis pesos 00/100 m.n.)**

A continuación firman los representantes de las compañías invitadas y personas que asistieron al presente acto, señalando que se pone a su disposición la presente acta y expresando que la falta de firma de algún representante **no invalida** el contenido ni efectos de la presente acta.

Dado por terminado el presente acto firmaran al calce las autoridades que intervinieron, como constancia del presente acto y para los efectos legales correspondientes:



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA,
ESTADO DE CAMPECHE
PERÍODO 2021- 2024
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO



FUNCIONARIOS

Ing. Julio Cesar Borjas Zúñiga

Director de Obras Públicas y Desarrollo Urbano del
Municipio de Candelaria.

Lic. Israel Said Elizalde Jiménez

Director de Planeación del Municipio de Candelaria.

L.A.F. Indira Patricia Tacú Pérez

Tesorera Municipal del Municipio de Candelaria.

L. en D. Martha Victoria Caballero Lugo

Titular del Órgano Interno de Control del Municipio de
Candelaria.

PARTICIPANTES

EMPRESA	REPRESENTANTE	FIRMA
1 C. LIZBETH PERALES BAUTISTA.	C. LIZBETH PERALES BAUTISTA.	
2 PROINHER, S.A. DE C.V.	C. LAURA IVET ZAMORANO PAREDES.	
3 C. CARLOS DE JESUS ORTEGA ALVAREZ.	C. CARLOS DE JESUS ORTEGA ALVAREZ.	

**ESTAS FIRMAS CORRESPONDEN AL ACTA DE FALLO,
CONCURSO No. MCA/DOPDU/ FAISM-SJ-01/2022.**

Pág. 2/2

